

市役所本庁舎整備事業について


1 進捗状況について

本庁舎を遠野市中心市街地活性化センター（通称：とぴあ）南側の一角とする整備計画（とぴあ庁舎を活用し、2階渡り廊下で接続する方式）については、平成26年12月27日、下図のとおり区割りが内定し、平成27年3月9日から物件移転補償契約を開始している。



【とぴあ南側区画】

とぴあ庁舎

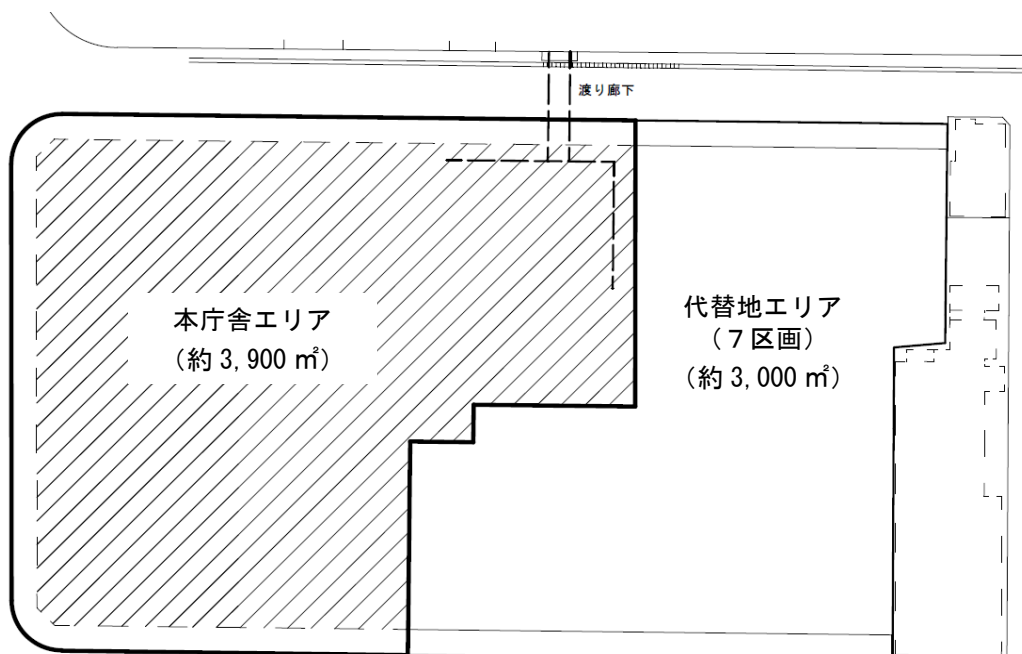

2 これまでの経過 (平成27年1月26日開催遠野市総合計画審議会以降分)

- | | |
|------------|--|
| 平成27年1月30日 | 第6回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 |
| 平成27年2月25日 | 遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ提言書を市長へ提出。 |
| 平成27年3月6日 | 市議会定例会において、遠野市一般会計補正予算（第9号）本庁舎整備事業 129,643 千円可決。 |
| 平成27年3月9日 | 物件移転補償契約開始。 |
| 平成27年3月13日 | 市議会定例会において、平成27年度当初予算本庁舎整備事業 1,468,807 千円可決。 |

3 今後の予定

- 平成27年4月 本庁舎整備について県へ事業認定申請
- 5月 税務署協議（公拡法・土地収用法に伴う税控除）
- 6月 本庁舎整備について県の事業認定許可（予定）
- 9月 本庁舎建設実施設計完了
- 10月 本庁舎建設工事着手
- 平成29年3月 本庁舎建設工事完成

4 建物構造・規模（案）

鉄筋コンクリート構造（木質化）3階、地下1階建

建築面積 1,500m²

延べ面積 5,200m² + 現在のとぴあ庁舎面積 2,200m² = 計 7,400m²
